



Project Plan v0.1

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύνθεση Ομάδας	3
Pert Chart	4
Gantt Chart	6
Ανάθεση Έργου σε Ανθρώπινο Δυναμικό	.7
Εκτίμηση Κόστους	8

### Σύνθεση Ομάδας

Η ομάδα μας αποτελείται από τρία (3) μέλη. Παρακάτω, παρατίθενται τα μέλη της ομάδας, καθώς και τα προσωπικά τους στοιχεία.



Βασιλική – Ευαγγελία Δούρου

AM: 1072633

Έτος: 4ο

up1072633@upnet.gr



Δημήτριος Μπαλάφας

AM: 1072499

Έτος : 4ο

up1072499@upnet.gr



Θωμάς - Χρυσοβαλάντης Ταμβάκης

AM: 1072631


Έτος: 4ο


up1072631@upnet.gr


#### **Pert Chart**

Για την εκπόνηση του Pert Chart θεωρούμε πως ένας πελάτης έχει έρθει ήδη σε επαφή με την ομάδα μας και ενδιαφέρεται για την υλοποίηση της ιδέας. Σύμφωνα με το παραπάνω σενάριο, θα δημιουργηθούν 3 ομάδες των 5 ατόμων με επικεφαλής έναν από εμάς η καθεμία.

Ακολουθεί το Pert Chart για το έργο.

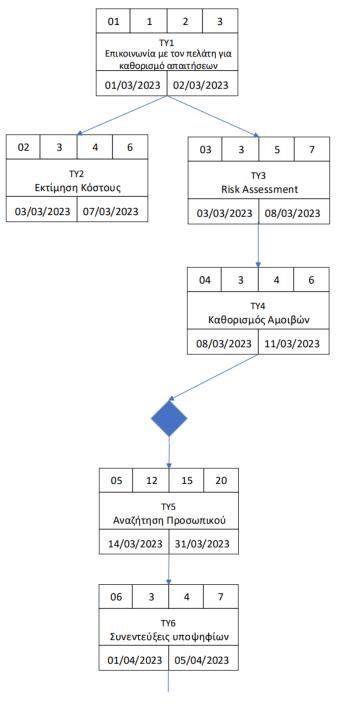

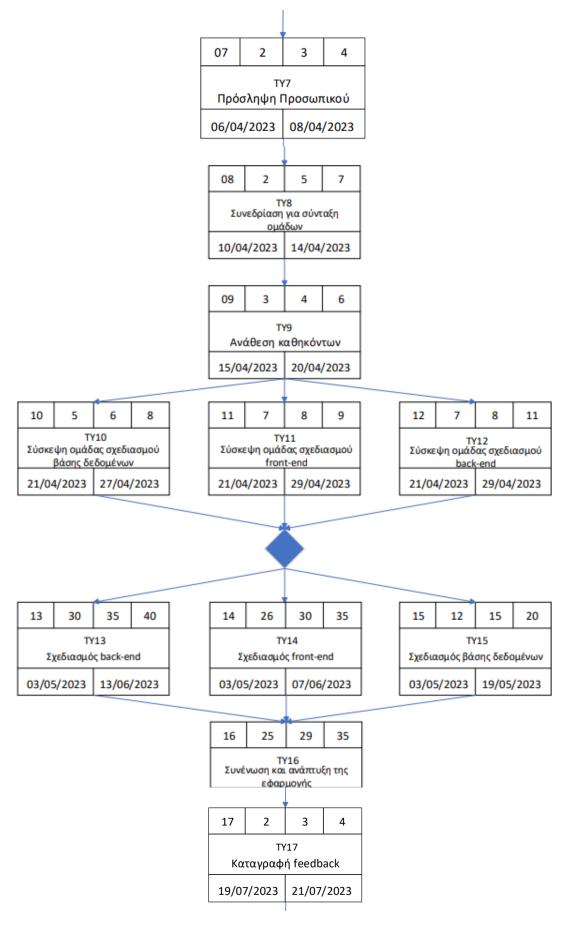


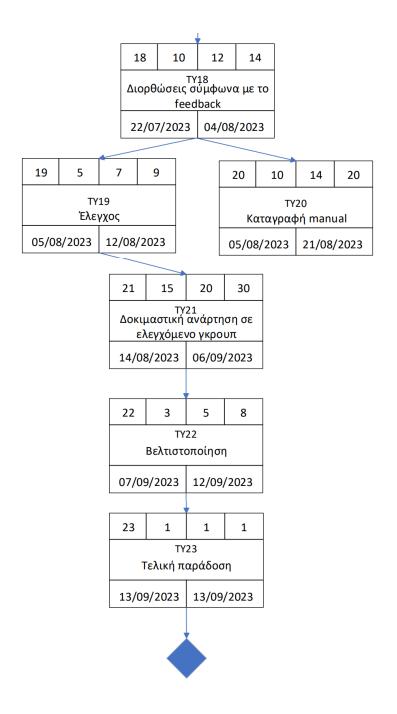

#### **Gantt Chart**

Ως ημερομηνία έναρξης θεωρείται η 01/03/2023. Οι εργάσιμες μέρες είναι από Δευτέρα έως Σάββατο και οι αργίες ακολουθούνται κανονικά. Το Gantt chart ακολουθεί το προαναφερθέν σενάριο.



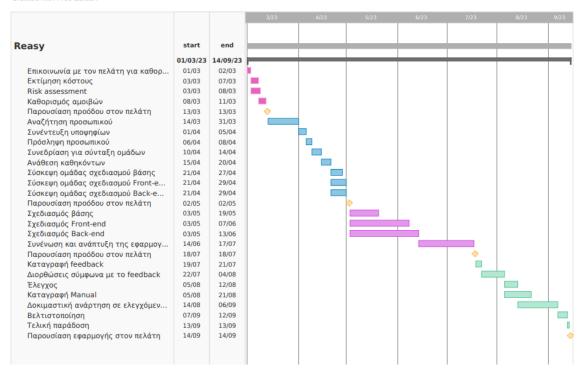

#### Ανάθεση Έργου σε Ανθρώπινο Δυναμικό

Στον παρακάτω πίνακα, έχουν τοποθετηθεί τα Τυπικά Υποέργα στη σειρά. Σε κάθε γραμμή αναγράφεται ο τίτλος και ο υπεύθυνος του εκάστοτε υποέργου. Για ευκολία, στο ανθρώπινο δυναμικό θέτουμε **B** για την Βασιλική-Ευαγγελία Δούρου, **Θ** για τον Θωμά-Χρυσοβαλάντη Ταμβάκη και **Δ** για τον Δημήτριο Μπαλάφα. Θεωρείται ότι η διαθεσιμότητα όλων των μελών της ομάδας είναι 100%.

ТҮПІКО ҮПОЕРГО	ΤΙΤΛΟΣ	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
(TY)		ΔΥΝΑΜΙΚΟ
TY1	Επικοινωνία με τον	Θ, Β, Δ
	πελάτη για	
	καθορισμό	
	απαιτήσεων	
TY2	Εκτίμηση Κόστους	Θ
TY3	Risk Assessment	В, Δ
TY4	Καθορισμός Αμοιβών	Θ, Β, Δ

ΤΥ5         Αναζήτηση Προσωπικού         Θ, Β, Δ           ΤΥ6         Συνεντεύξεις υποψηφίων         Θ, Β, Δ           ΤΥ7         Πρόσληψη Θ, Β, Δ           Προσωπικού         Θ, Β, Δ           ΤΥ8         Συνεδρίαση για σύνταξη ομάδων         Θ, Β, Δ           ΤΥ9         Ανάθεση καθηκόντων         Θ, Β, Δ           ΤΥ10         Σύσκεψη ομάδας σχεδιασμού βάσης δεδομένων         Θ           ΤΥ11         Σύσκεψη ομάδας σχεδιασμού front-end         Β           ΤΥ12         Σύσκεψη ομάδας σχεδιασμού back-end         Β           ΤΥ13         Σχεδιασμός back-end         Β           ΤΥ14         Σχεδιασμός βάσης δεδομένων         Θ           ΤΥ15         Σχεδιασμός βάσης δεδομένων         Θ           ΤΥ16         Συνένωση και ανάπτυξη της εφαρμογής         Θ, Β, Δ           ΤΥ17         Καταγραφή συμα της εφαρμογής         Θ, Β, Δ           ΤΥ18         Διορθώσεις σύμφωνα με το feedback         Θ, Β, Δ           ΤΥ20         Καταγραφή manual         Θ, Δ           ΤΥ21         Δοκιμαστική ανάρτηση σε ελεγχόμενο γκρουπ         Θ, Β, Δ           ΤΥ22         Βελποτοποίηση Θ, Β, Δ           ΤΥ23         Τελική παράδοση Θ, Β, Δ			
ΤΥ6         Συνεντεύξεις υποψηφίων         Θ, Β, Δ           ΤΥ7         Πρόσληψη Θ, Β, Δ           Προσωπικού         Θ, Β, Δ           ΤΥ8         Συνεδρίαση για σύνταξη ομάδων         Θ, Β, Δ           ΤΥ9         Ανάθεση καθηκόντων         Θ, Β, Δ           ΤΥ10         Σύσκεψη ομάδας σχεδιασμού βάσης δεδομένων         Θ           ΤΥ11         Σύσκεψη ομάδας σχεδιασμού back-end         Β           ΤΥ12         Σύσκεψη ομάδας σχεδιασμού back-end         Β           ΤΥ13         Σχεδιασμός βάσης δεδομένων         Θ           ΤΥ14         Σχεδιασμός βάσης δεδομένων         Θ           ΤΥ15         Σχεδιασμός βάσης δεδομένων         Θ           ΤΥ16         Συνένωση και ανάπτυξη της εφαρμογής         Θ, Β, Δ           ΤΥ17         Καταγραφή Θ, Β, Δ           πούμφωνα με το feedback         Θ, Β, Δ           ΤΥ18         Διορθώσεις σύμφωνα με το feedback         Θ, Β, Δ           ΤΥ19         Έλεγχος Β         Β           ΤΥ20         Καταγραφή manual Θ, Δ         Θ, Β, Δ           ΤΥ21         Δοκιμαστική ανάρτηση σε ελεγχόμενο γκρουπ         Θ, Β, Δ           ΤΥ22         Βελτιστοποίηση Θ, Β, Δ	TY5		Θ, Β, Δ
ΤΥ7 Πρόσληψη Θ, Β, Δ Προσωπικού  ΤΥ8 Συνεδρίαση για Θ, Β, Δ σύνταξη ομάδων  ΤΥ9 Ανάθεση Θ, Β, Δ καθηκόντων  ΤΥ10 Σύσκεψη ομάδας σχεδιασμού βάσης δεδομένων  ΤΥ11 Σύσκεψη ομάδας Δ σχεδιασμού front-end  ΤΥ12 Σύσκεψη ομάδας Β σχεδιασμού back-end Β ΤΥ14 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων  ΤΥ15 Σχεδιασμός βάσης Θ δεδομένων  ΤΥ16 Συνένωση και Θ, Β, Δ ανάπτυξη της εφαρμογής  ΤΥ17 Καταγραφή Θ, Β, Δ σύμφωνα με το feedback  ΤΥ18 Διορθώσεις Θ, Β, Δ ΤΥ20 Καταγραφή παπυαl Θ, Δ ΤΥ21 Δοκιμαστική Θ, Β, Δ ανάρτηση σε ελεγχόμενο γκρουπ ΤΥ22 Βελτιστοποίηση Θ, Β, Δ	TY6	Συνεντεύξεις	Θ, Β, Δ
ΤΥ8 Συνεδρίαση για σύνταξη ομάδων  ΤΥ9 Ανάθεση Θ, Β, Δ καθηκόντων  ΤΥ10 Σύσκεψη ομάδας Θ σχεδιασμού βάσης δεδομένων  ΤΥ11 Σύσκεψη ομάδας σχεδιασμού front-end  ΤΥ12 Σύσκεψη ομάδας Β σχεδιασμού back-end  ΤΥ13 Σχεδιασμός back-end Β ΤΥ14 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων  ΤΥ16 Συνένωση και ανάπτυξη της εφαρμογής  ΤΥ17 Καταγραφή Θ, Β, Δ σύμφωνα με το feedback  ΤΥ18 Διορθώσεις Θ, Β, Δ σύμφωνα με το feedback  ΤΥ19 Έλεχος Β ΤΥ20 Καταγραφή παπυαl Θ, Δ  ΤΥ21 Δοκιμαστική Θ, Β, Δ  ανάρτηση σε ελεγχόμενο γκρουπ  ΤΥ22 Βελπιστοποίηση Θ, Β, Δ	TY7	Πρόσληψη	Θ, Β, Δ
TY10   Σύσκεψη ομάδας   Θ	TY8	Συνεδρίαση για	Θ, Β, Δ
σχεδιασμού βάσης δεδομένων  TY11 Σύσκεψη ομάδας σχεδιασμού front-end  TY12 Σύσκεψη ομάδας σχεδιασμού back- end  TY13 Σχεδιασμός back-end B  TY14 Σχεδιασμός front-end  Δ  TY15 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων  TY16 Συνένωση και Θ, Β, Δ ανάπτυξη της εφαρμογής  TY17 Καταγραφή Θ, Β, Δ feedback  TY18 Διορθώσεις Θ, Β, Δ σύμφωνα με το feedback  TY19 Έλεγχος B  TY20 Καταγραφή manual Θ, Δ ΤΥ21 Δοκιμαστική Θ, Β, Δ ανάρτηση σε ελεγχόμενο γκρουπ  TY22 Βελτιστοποίηση Θ, Β, Δ	TY9	•	Θ, Β, Δ
ΤΥ12   Σύσκεψη ομάδας   Β     σχεδιασμού back-end   Ε     ΤΥ13   Σχεδιασμός back-end   Β     ΤΥ14   Σχεδιασμός front-end   Δ     ΤΥ15   Σχεδιασμός βάσης   Θ     δεδομένων   ΓΥ16   Συνένωση και   ανάπτυξη της     εφαρμογής   ΤΥ17   Καταγραφή   Θ, Β, Δ     σύμφωνα με το     feedback   ΓΥ19   Έλεγχος   Β     ΤΥ20   Καταγραφή   Θ, Β, Δ     ανάρτηση σε     ελεγχόμενο γκρουπ   ΓΥ22   Βελτιστοποίηση   Θ, Β, Δ	TY10	σχεδιασμού βάσης	Θ
ΤΥ13   Σχεδιασμός back-end   Β	TY11		Δ
ΤΥ14       Σχεδιασμός front-end       Δ         ΤΥ15       Σχεδιασμός βάσης       Θ         δεδομένων       Θ, Β, Δ         ΤΥ16       Συνένωση και ανάπτυξη της εφαρμογής       Θ, Β, Δ         ΤΥ17       Καταγραφή Θ, Β, Δ         πε θε βασει σε σύμφωνα με το feedback       Θ, Β, Δ         ΤΥ19       Έλεγχος Β         ΤΥ20       Καταγραφή manual Θ, Δ         ΤΥ21       Δοκιμαστική Θ, Β, Δ         ανάρτηση σε ελεγχόμενο γκρουπ       Ελεγχόμενο γκρουπ         ΤΥ22       Βελτιστοποίηση Θ, Β, Δ	TY12	σχεδιασμού back-	В
<ul> <li>ΤΥ14 Σχεδιασμός front-end</li> <li>ΤΥ15 Σχεδιασμός βάσης</li> <li>Θ</li> <li>δεδομένων</li> <li>ΤΥ16 Συνένωση και ανάπτυξη της εφαρμογής</li> <li>ΤΥ17 Καταγραφή Θ, Β, Δ feedback</li> <li>ΤΥ18 Διορθώσεις Θ, Β, Δ σύμφωνα με το feedback</li> <li>ΤΥ19 Έλεγχος Β</li> <li>ΤΥ20 Καταγραφή manual Θ, Δ</li> <li>ΤΥ21 Δοκιμαστική Θ, Β, Δ ανάρτηση σε ελεγχόμενο γκρουπ</li> <li>ΤΥ22 Βελτιστοποίηση Θ, Β, Δ</li> </ul>	TY13	Σχεδιασμός back-end	В
ΤΥ15 Σχεδιασμός βάσης Θ δεδομένων  ΤΥ16 Συνένωση και Θ, Β, Δ ανάπτυξη της εφαρμογής  ΤΥ17 Καταγραφή Θ, Β, Δ feedback  ΤΥ18 Διορθώσεις Θ, Β, Δ σύμφωνα με το feedback  ΤΥ19 Έλεγχος Β ΤΥ20 Καταγραφή παηυαι Θ, Δ ΤΥ21 Δοκιμαστική Θ, Β, Δ ανάρτηση σε ελεγχόμενο γκρουπ ΤΥ22 Βελτιστοποίηση Θ, Β, Δ	TY14		Δ
ΤΥ16 Συνένωση και ανάπτυξη της εφαρμογής  ΤΥ17 Καταγραφή Θ, Β, Δ feedback  ΤΥ18 Διορθώσεις Θ, Β, Δ σύμφωνα με το feedback  ΤΥ19 Έλεγχος Β ΤΥ20 Καταγραφή manual Θ, Δ ΤΥ21 Δοκιμαστική Θ, Β, Δ ανάρτηση σε ελεγχόμενο γκρουπ ΤΥ22 Βελτιστοποίηση Θ, Β, Δ	TY15	Σχεδιασμός βάσης	Θ
<ul> <li>ΤΥ17 Καταγραφή Θ, Β, Δ feedback</li> <li>ΤΥ18 Διορθώσεις Θ, Β, Δ σύμφωνα με το feedback</li> <li>ΤΥ19 Έλεγχος Β</li> <li>ΤΥ20 Καταγραφή manual Θ, Δ</li> <li>ΤΥ21 Δοκιμαστική Θ, Β, Δ ανάρτηση σε ελεγχόμενο γκρουπ</li> <li>ΤΥ22 Βελτιστοποίηση Θ, Β, Δ</li> </ul>	TY16	Συνένωση και ανάπτυξη της	Θ, Β, Δ
σύμφωνα με το feedback  TY19 Έλεγχος B  TY20 Καταγραφή manual Θ, Δ  TY21 Δοκιμαστική Θ, Β, Δ ανάρτηση σε ελεγχόμενο γκρουπ  TY22 Βελτιστοποίηση Θ, Β, Δ	TY17	Καταγραφή	Θ, Β, Δ
ΤΥ20       Καταγραφή manual       Θ, Δ         ΤΥ21       Δοκιμαστική       Θ, Β, Δ         ανάρτηση σε       ελεγχόμενο γκρουπ         ΤΥ22       Βελτιστοποίηση       Θ, Β, Δ	TY18	σύμφωνα με το	Θ, Β, Δ
ΤΥ21 Δοκιμαστική Θ, Β, Δ ανάρτηση σε ελεγχόμενο γκρουπ ΤΥ22 Βελτιστοποίηση Θ, Β, Δ	TY19	Έλεγχος	В
ΤΥ21 Δοκιμαστική Θ, Β, Δ ανάρτηση σε ελεγχόμενο γκρουπ ΤΥ22 Βελτιστοποίηση Θ, Β, Δ		Καταγραφή manual	Θ, Δ
ΤΥ22 Βελτιστοποίηση Θ, Β, Δ	TY21	ανάρτηση σε	
	TY22		Θ, Β, Δ
	TY23		

## Εκτίμηση Κόστους

Παρακάτω εμφανίζονται οι πίνακες, οι οποίοι περιέχουν το άμεσο και το έμμεσο κόστος που θα προκύψει αφού παραδώσουμε το έργο μας.

Άμεσο Κόστος		
Εργαζόμενοι για την παραγωγή του έργου ανά ομάδες :		
Ομάδα Βασιλικής Ευαγγελίας	58.800€	
Ομάδα Θωμά Χρυσοβαλάντη	58.800€	
Ομάδα Δημήτρη	58.800€	
Σύνολο Άμεσου Κόστους	176.400€	

Έμμεσο Κόστος		
Ρεύμα	4.500€	
Διαδίκτυο και Τηλέφωνο	600€	
Νερό	350€	
Ενοίκιο	7.900€	
Πιθανές μεταφορές για δια ζώσης meetings	1.700€	
Νομική Ομάδα	2.500€	
Λογιστική Ομάδα	1.800€	
Ομάδα Marketing	3.100€	
Σύνολο Έμμεσου Κόστους	22.450€	

Συνολικό Κόστος	198.850€
